



GRUPO BRICKET

INFORME MENSUAL

Proyecto Residencial ARAYA

INFORME N°

06 / 2026

PERÍODO

01 al 30 de junio, 2026

Preparado por: Gerencia Financiera del Fideicomiso | Uso confidencial

Agenda

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | Estatus de Terrenos | 07 | Informe Financiero |
| 02 | Estatus de Permisos | 08 | Control Presupuestal |
| 03 | Gestiones Comerciales | 09 | Flujo y Requerimientos de Recursos |
| 04 | Informe de Ventas | 10 | Cuentas por Pagar Comerciales y Financieras |
| 05 | Informe de Obras | 11 | Gestiones Financieras |
| 06 | Avance de Obras — Edificios y Urbanismo | 12 | Puntos para Aprobación |

Estatus de Permisos

CONFOTUR: concluida la evaluación técnica; a la espera de la reunión de consejo.


TRÁMITE	N° EXPEDIENTE	FECHA	ESTATUS
No objeción Ayuntamiento Higüey	S/N	15/01/24	APROBADO
No objeción Ayuntamiento Verón	S/N	19/02/24	APROBADO
No objeción Ministerio de Medio Ambiente	DEIA-3249-2023	22/10/23	APROBADO
No objeción Turismo	DPPP01-01611	19/04/24	APROBADO
Permiso CPEM	9078286-ARAYA	—	APROBADO
Permiso INAPA	S/N	30/11/23	APROBADO
Licencia Construcción MIVED	VUC0255-2024	12/02/24	APROBADO
Clasificación provisional CONFOTUR	NÚM. 61-2025	10/10/24	APROBADO
Clasificación definitiva CONFOTUR	CONFOTUR01-01201	—	EN PROCESO

Clasificación definitiva CONFOTUR: en proceso.



Informe de Ventas

Reservas Totales



Junio De 2026

Total: 18


- Caribcasa: 1
- Realtor Faride Rojas: 1
- Blue Caribbean properties: 2
- NAVIA REAL ESTATE RD: 1
- Remax Paradise: 2
- Punta Cana Solutions: 4
- Plusval Puntacana: 3
- Acervo Inmobiliario: 4

279 Reservadas

16.5 por Mes.

228 Activas

14.25 por Mes



Situación Inventario




Metas de Recaudación **FASE I US\$22.1M**
FASE II US\$25.2M

228 Activas

136 Activas - 87% Fase I

92 Activas - 54% Fase II

*51 Desistidas - 18% de las Reservas.



Para el mes de mayo teníamos 217 Unidades Activas.

De la Fase II se han reservado 92 Unidades (28 Garden, 32 Sunset y 32 Balcony Flex).

Reservas por Modelos



Balcony – 6.3 Unidades / Mes
Garden – 5.6 Unidades / Mes
Sunset – 5.2 Unidades / Mes
Flex – 3.8 Unidades / Mes

Marzo De 2026

Total: 31

- Sunset: 14
- Balcony Flex: 11
- Garden: 6

Abril De 2026

Total: 26

- Balcony Flex: 7
- Balcony: 1
- Sunset: 6
- Garden: 12

Mayo De 2026


Total: 25

- Sunset: 9
- Balcony Flex: 9
- Garden: 7

Junio De 2026

Total: 18


- Sunset: 10
- Balcony Flex: 6
- Garden: 2



De las 18 Reservas, se destaca que 4 fueron del equipo interno ARAYA y 4 fueron de Punta Cana Solutions

Reservas por Modelos

Actualizado 30JUN2026



Reservas por Ubicacion



Actualizado 30JUN2026

Interior

Total: 49

- Garden: 13
- Sunset: 16
- Balcony Flex: 20

Parque Central + Vista

Total: 20

- Garden: 6
- Sunset: 8
- Balcony Flex: 6

Parque Central


Total: 13

- Garden: 4
- Sunset: 5
- Balcony Flex: 4


Lateral

Total: 10

- Garden: 5
- Sunset: 3
- Balcony Flex: 2

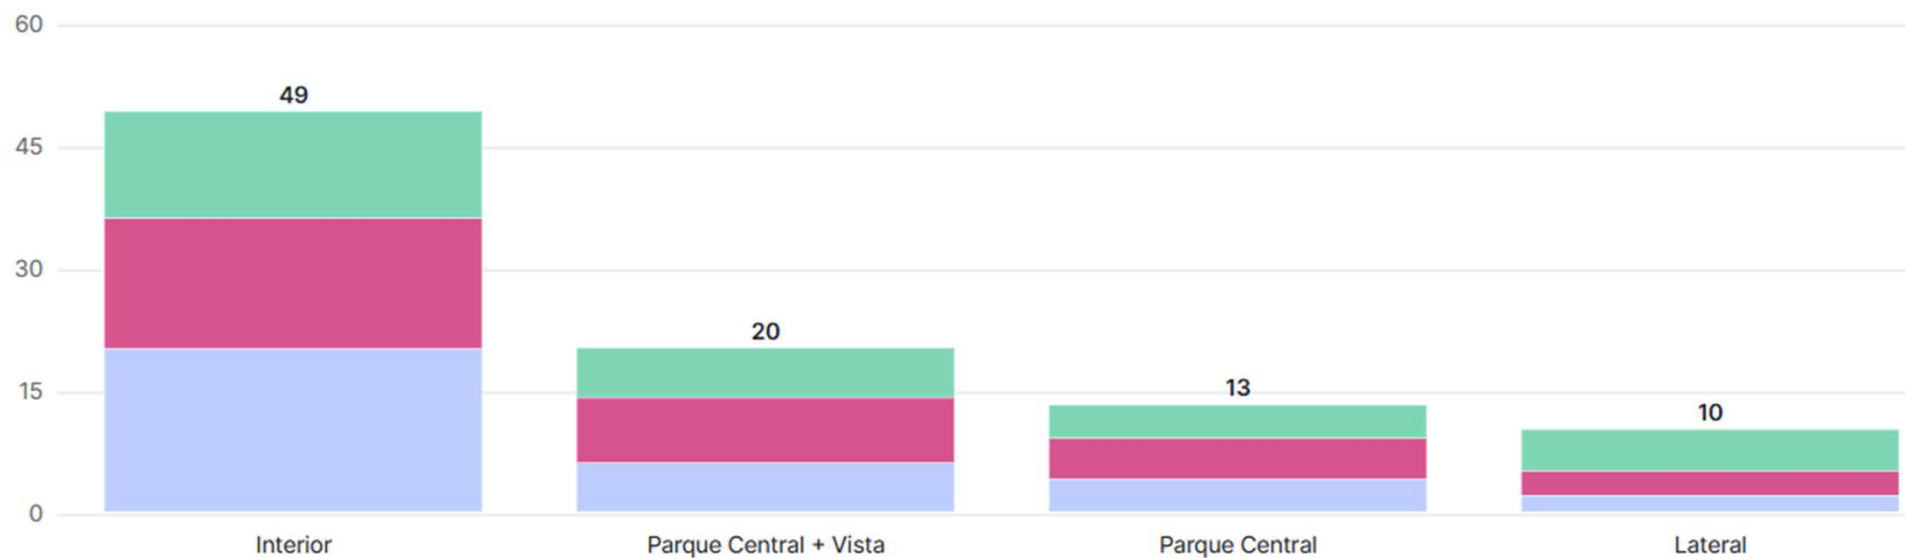


Ventas Depuradas



198 Unidades Depuradas
30 Unidades por Depurar

161 unidades vinculadas al 30 de junio, 11 en proceso de vinculacion y 26 en proceso de firma del contrato.


Al cierre de mes hay 6 cliente en proceso de depuración y 24 clientes a la espera de documentos.

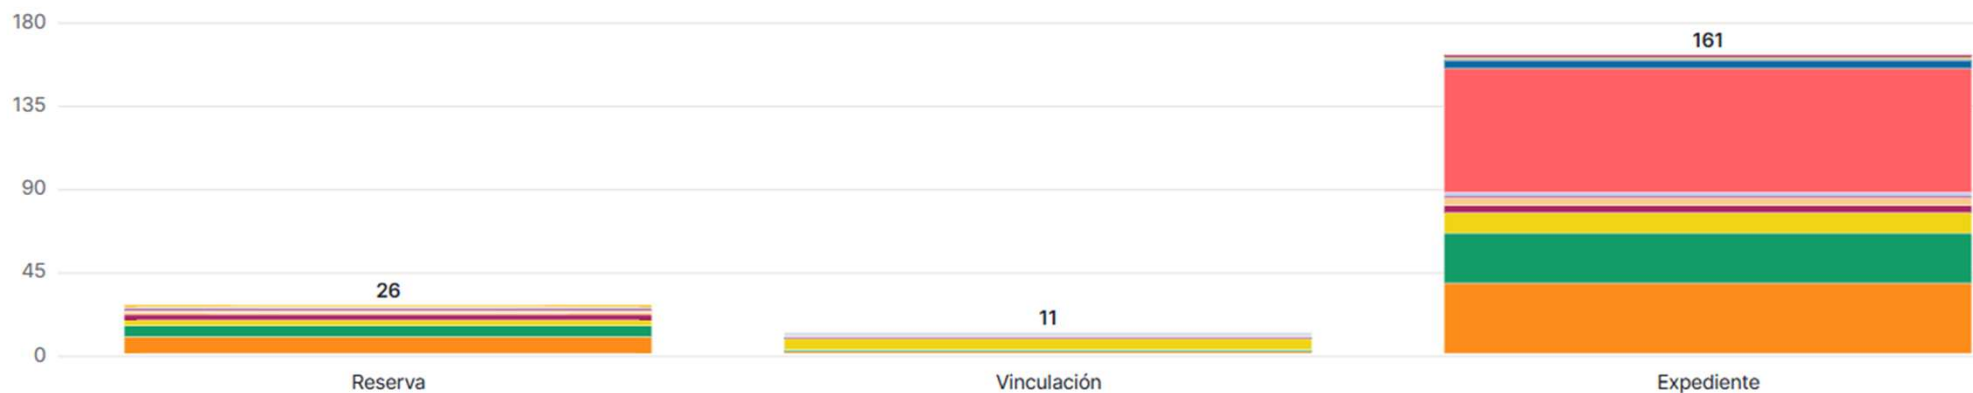

Ventas Vinculadas por Mes




164 Unidades Vinculadas
3 Fueron desistidas



Estatus de Cobranza



De los 172 clientes con contratos al 06/07/2026, tenemos 106 clientes al día, 42 clientes con cuotas pendientes y 24 clientes con cuotas vencidas



Debido a los pagos adelantados de los clientes al día, se ha logrado el recaudo mas del 97% de lo proyectado según las ventas formalizadas.

Average Loan Disbursement Size (All Time)

141,566.00

Rate of Recovery (Open Loans)

Percentage of the due amount that is paid for open loans until today

100.41%


COBRANZA MENSUAL		
Periodo	Proyectado	Recaudado
abr-25	\$0.00	\$31,983.00
may-25	\$17,611.25	\$82,660.00
jun-25	\$295,375.12	\$226,916.48
jul-25	\$329,618.95	\$345,511.70
ago-25	\$351,439.91	\$267,834.82
sep-25	\$205,124.03	\$312,411.25
oct-25	\$205,232.92	\$340,929.79
nov-25	\$293,670.39	\$169,940.95
dic-25	\$212,765.00	\$240,327.84
ene-26	\$130,612.79	\$145,589.20
feb-26	\$304,321.19	\$267,568.63
mar-26	\$219,239.81	\$291,943.42
abr-26	\$401,884.61	\$297,484.53
may-26	\$401,209.90	\$292,327.36
jun-26	\$345,006.93	\$293,468.93
TOTAL	\$3,713,112.80	\$3,606,897.90

* Valor proyectado basado en los planes de pago

Estatus de Cobranza



**Monto Total Vencido
US\$ 136,840.39**

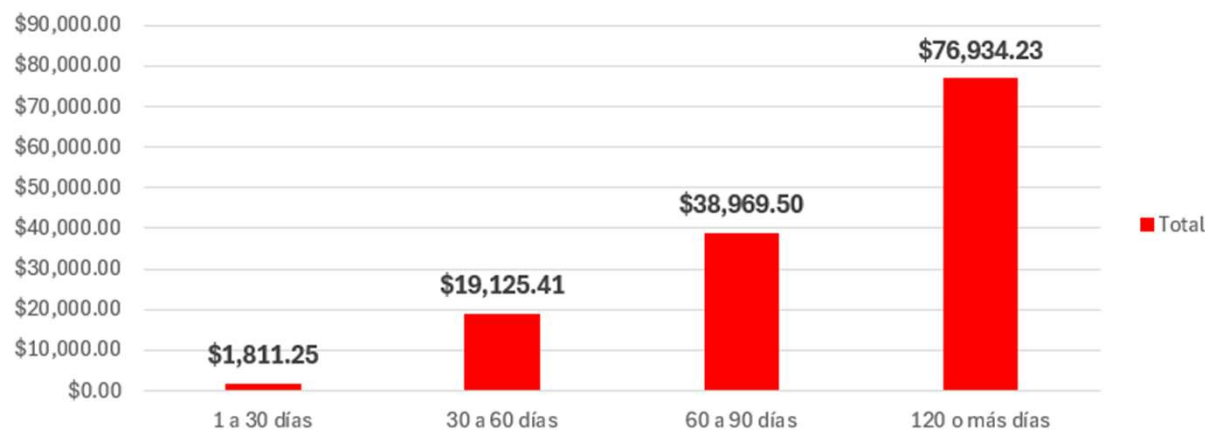

Al 06/07/2026 se tienen 24 clientes con cuotas vencidas

US\$ 50,864.87 corresponden a monto de separación pendientes por pagar. (4 clientes).

US\$ 54,163.38 corresponden a cuotas pendientes de pago (15 clientes).

US\$ 31,812.19 corresponden a cuotas pendientes de realtors (5 clientes)

La morosidad no supera el 1%

Comentarios Generales



- En junio subimos el precio de las unidades Parque + Vista y Laterales:

Parque + Vista		Lateral	
167,200.00	169,500.00	160,100	162,500
163,000.00	167,200.00	137,000	139,000
141,000.00	145,200.00	155,000	159,000

De este aumento se vendieron este mes 2 Sunset Parque + Vista y 1 Sunset Lateral

- Visita de 20 empresarios de Shangai, coordinada por Keller Williams By Lacig
- Vista de la Inmobiliaria Exp Realty Pedro Reyes y Eduardo Sánchez



A close-up photograph of several green palm fronds. The fronds are long and narrow, with visible veins. In the background, a bright sun is shining through the leaves, creating a strong lens flare and illuminating the scene with a warm, golden light. The text "Avance de Obra" is overlaid in the bottom right corner in a white serif font.

Avance de Obra

Resumen Ejecutivo

Estado consolidado del proyecto al corte 30/06/2026

18.23%

Avance físico ejecutado

vs 21.24% planificado

-3.0 pp

Brecha vs. plan

Eficiencia: 86% del plan

14

Edificios con orden de materiales YA VENCIDA

de los 26 (incl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)

0%

Avance de carpintería, ventanas y piezas sanitarias

en los 26 edificios, sin excepción

5

Días de retraso del proyecto (cronograma general)

vs. línea base — corte 30/06/2026

LECTURA DEL CORTE

Curva S: el proyecto ejecutó 18.23% del monto acumulado contra 21.24% planificado a junio 2026 — una eficiencia del 86% respecto al plan operativo.


Estructura (26 edificios): 7 edificios (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) tienen su estructura 100% terminada; 5 edificios (7, 8, 10, 11, 12) están en el tramo final (90% avance) con atrasos puntuales de 2 a 30 días, encabezados por el Edificio 8 (30 días) y Edificio 7 (23 días); los 14 edificios restantes (13 a 18 y 70 a 77) aún no inician estructura. A nivel de proyecto completo, la variación es de solo 5 días vs. línea base.

Acabados — el hallazgo crítico: los Edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 tienen su estructura 100% terminada desde marzo–mayo 2026, pero carpintería, herrería y ventanas siguen en 0% de avance físico. El pedido de estos materiales debió colocarse hace 60 a 90 días.

Urbanismo: 4% de avance general; 13 partidas de infraestructura ya debieron iniciar y no lo han hecho, con atrasos de hasta 14 días.

Curva S — Plan vs. Ejecutado


Avance físico acumulado del proyecto (% del monto total) · jun-2025 a ago-2027

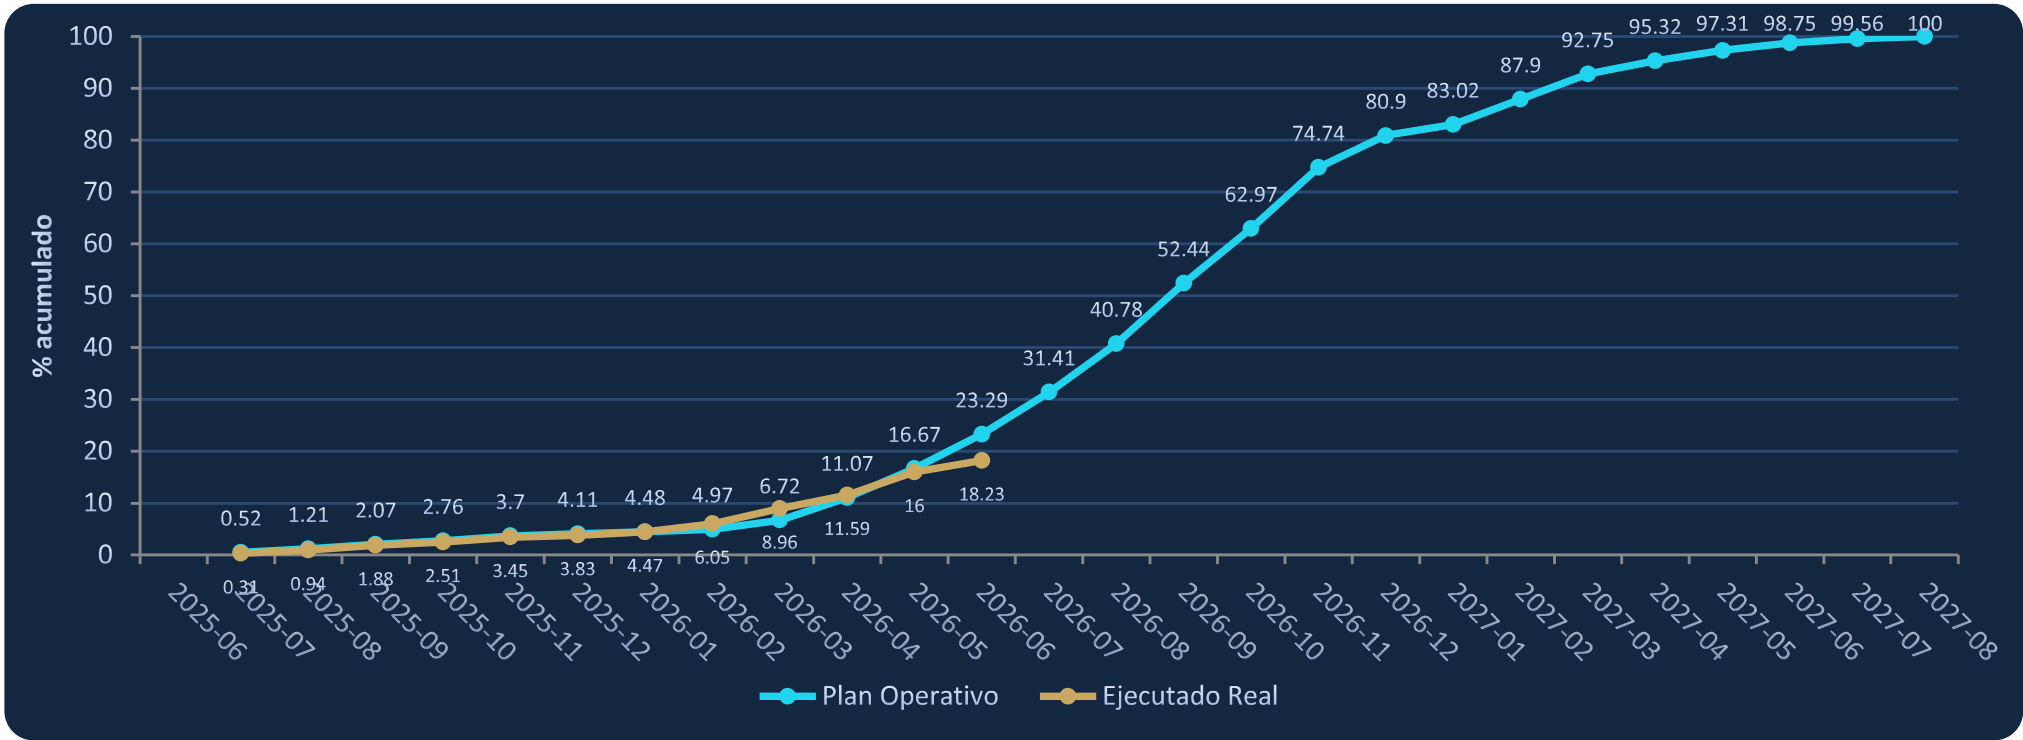

Al corte (jun-2026): Ejecutado 18.23% vs. Plan 21.24% → brecha de 3.0 puntos porcentuales. El plan proyecta cierre en agosto-2027; sin corrección, la brecha actual se traduce en un desplazamiento equivalente en el cierre.

Cronograma de Estructura — 26 Edificios


Días de atraso proyectados en el fin de estructura (fecha actual vs. línea base)

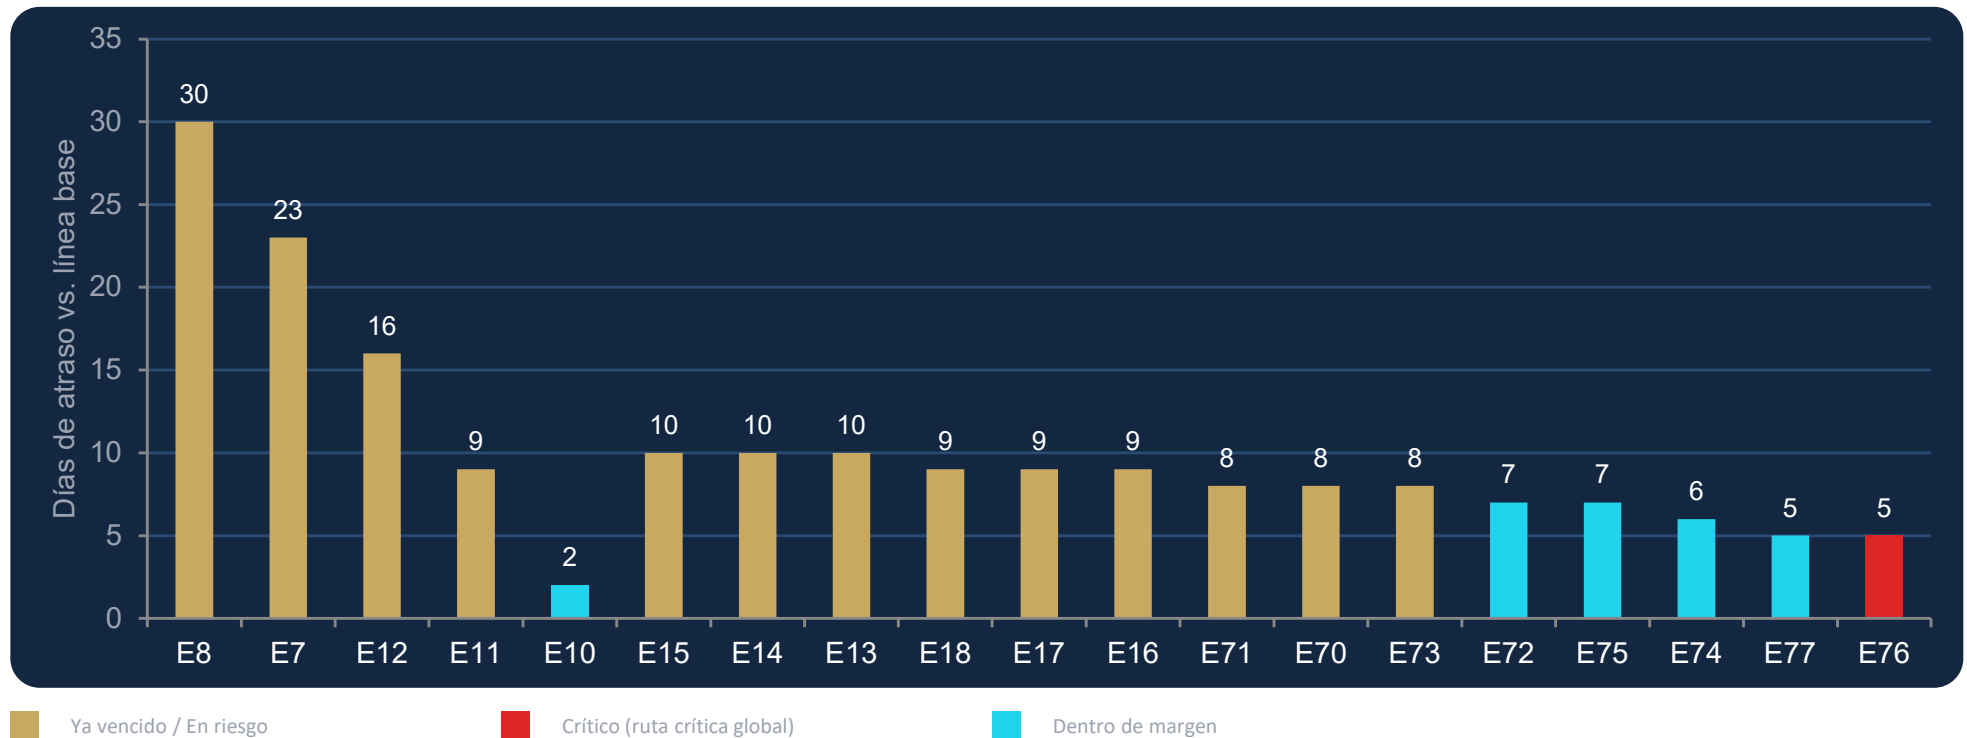

19 de 26 edificios continúan en construcción (5 en fase final de estructura, 14 sin iniciar). Los edificios 7, 8, 11 y 12 (fase de transición) concentran los mayores atrasos absolutos (9–30 días); el proyecto completo acumula solo 5 días de atraso vs. línea base.

Avance Físico por Capítulo — Los 26 Edificios


% ejecutado del presupuesto contratado por disciplina, acumulado en todos los edificios (Cubicación N°7)

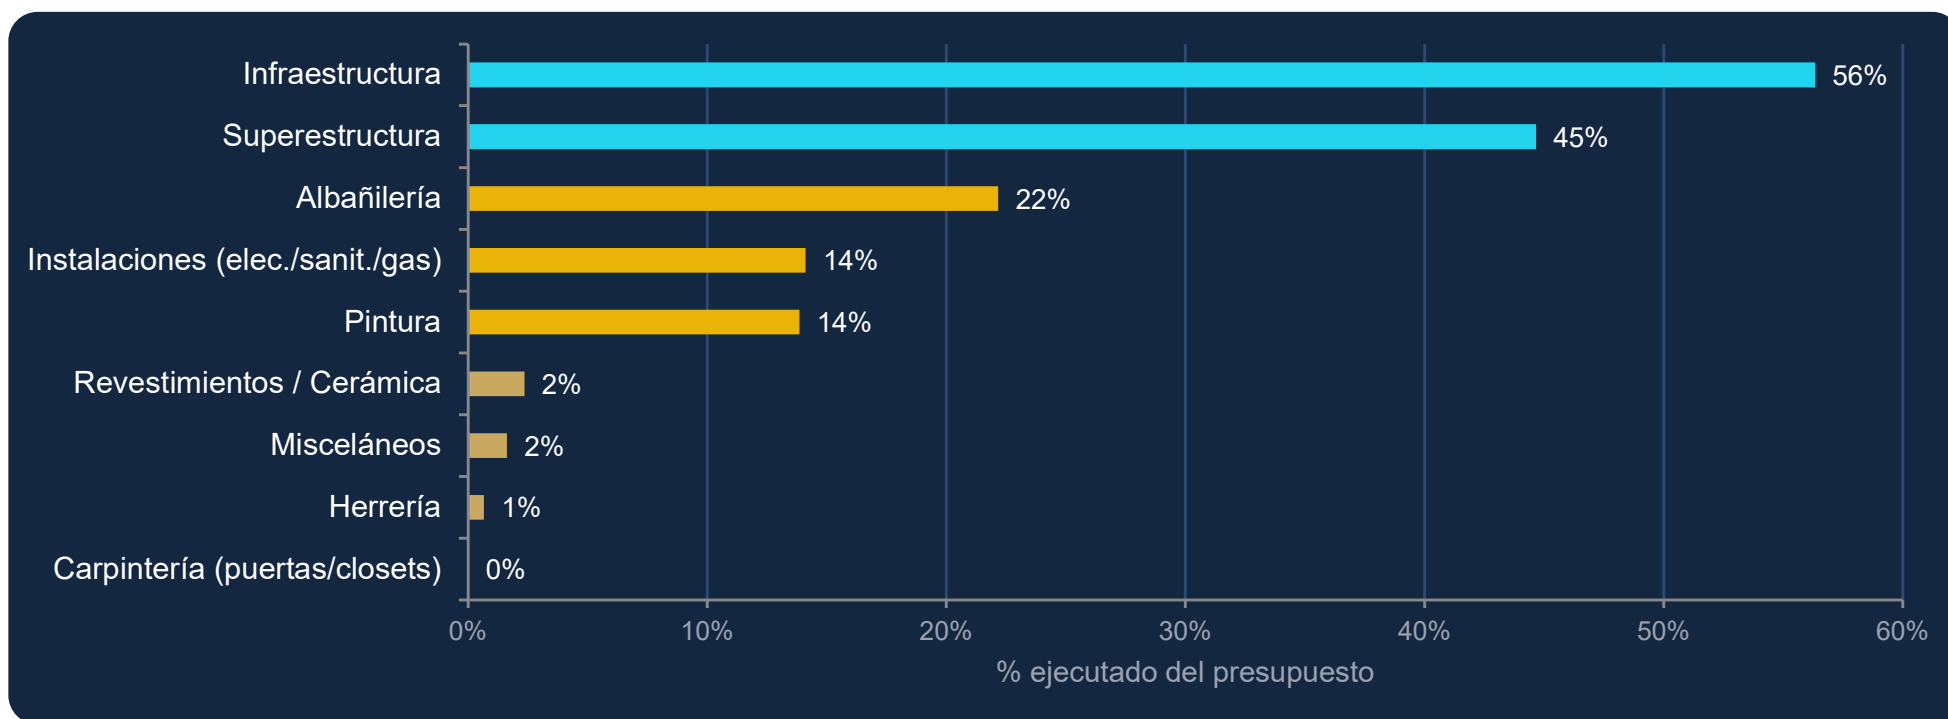

Carpintería, Ventanas y Piezas Sanitarias: 0% en los 26 edificios — ningún pedido ni instalación registrada todavía. **Herrería (0.7%) y Revestimientos/Cerámica (2.4%)** apenas iniciaron. Son las disciplinas que definirán si se sostiene la fecha de entrega, no la estructura.

Flujo de Obra — Requerimiento vs. Real

Urbanismo y Edificios · Diciembre 2025 a Junio 2026

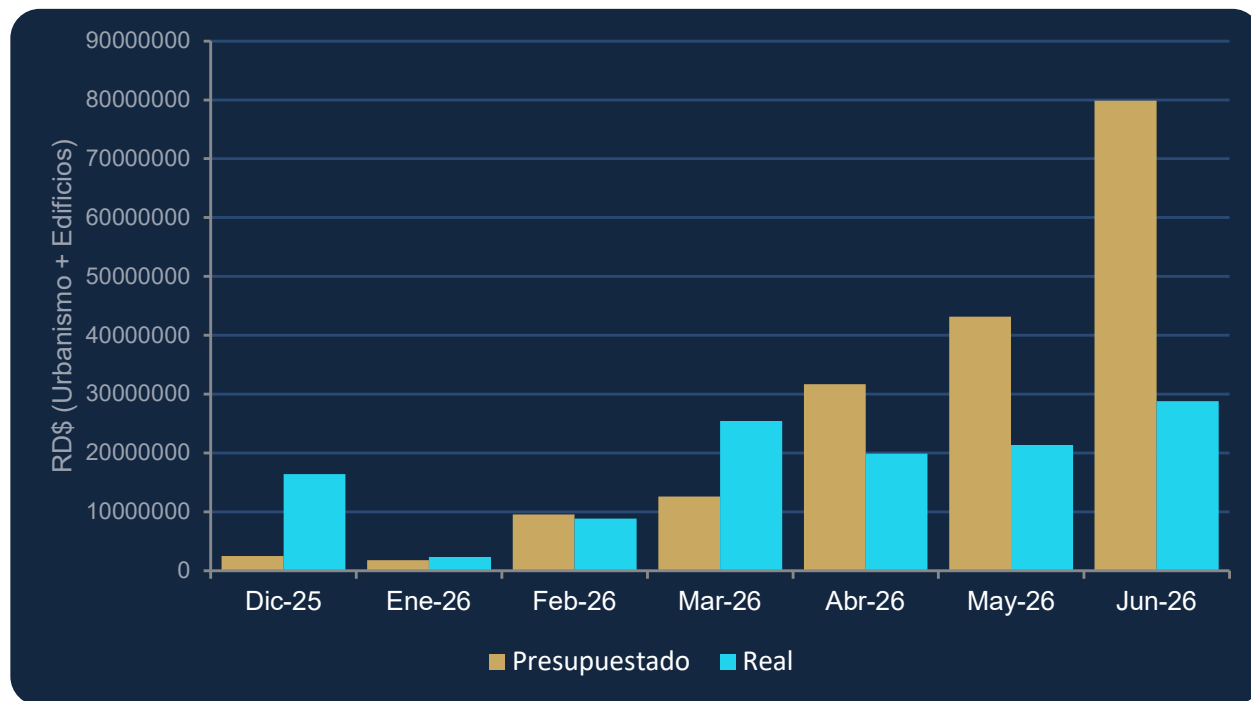

\$32.2M

Urbanismo — real

vs \$25.7M requerido.

\$91.0M

Edificios — real

vs \$155.5M requerido.

Urbanismo sobregiró \$6.4M frente al plan (pago adelantado del contrato de Movimiento de Tierra en dic-2025); en junio, sin embargo, quedó \$5.7M por debajo de lo requerido. **Edificios** dejó \$64.5M sin ejecutar (de los cuales \$45.3M corresponden solo a junio), reflejando los atrasos de estructura y acabados ya identificados.

Seguridad y Salud en el Trabajo — Resumen

0

Accidentes registrados

Semanas 3 y 4 de junio

120

Personal en obra (última semana)

vs. 80 en la semana 1

192

Horas-hombre acumuladas

Semanas 1 a 4 de junio

22

Reportes de observación

21 reuniones de seguridad

3

Acciones correctivas en proceso

Ver seguimiento detallado

LECTURA DEL PERIODO

Cero accidentes: sin eventos registrables, incidentes ambientales/sociales ni días perdidos en las dos semanas reportadas (S3 y S4 de jun-26).

Personal en crecimiento: la dotación pasó de 80 (semana 1) a 120 personas (semana 4), con incorporación de nuevos oficios (maestro, excavadores, formaleas, eléctricos) acorde al avance de obra.

Gestión preventiva activa: 12 inspecciones, 22 reportes de observación y 21 reuniones de seguridad en el periodo — sin auditorías ni capacitaciones formales registradas aún.

Nota: se recibieron los reportes de las semanas 3 y 4 de junio; el de la semana 2 no fue proporcionado y no se incluye en este resumen.

Actos, Condiciones Inseguras y Buenas Prácticas

Hallazgos de campo y seguimiento a acciones correctivas · junio 2026

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

- Personal sin EPP
- Escombros acumulados
- Metal incrustado
- Desechos en obra
- Exceso de clavos en áreas de encofrado (S3)
- Uso de extensiones eléctricas en mal estado (S4)

BUENAS PRÁCTICAS

- Designar contratistas para la eliminación de escombros acumulados.
- Buenas respuestas ante las solicitudes de seguridad.
- Cerrar excavaciones y terminar delimitación y señalización (S3).
- Suplir al personal con EPP adecuados (S3).
- Eliminación de extensiones eléctricas en mal estado (S4).
- Operativo de entrega de calzado de seguridad al personal de obra (S4).

SEGUIMIENTO A ACCIONES

Escombros acumulados

Acción: Designar contratista para eliminación de gran cantidad de escombros acumulados. (EN PROCESO)

Área mecánica de carga de materiales con escombros, violando el perímetro delimitado.

Acción: Delimitación del área mecánica de izaje de carga para mantenerla libre de escombros y desperfectos mecánicos. (EN PROCESO)

Personal sin EPP adecuados (tenis, sin casco, sin protección auditiva/facial, sin arnés).

Acción: Se le suministro los EPP a todo el personal

Alternativas para Recuperar Plazo

Opciones evaluadas para cerrar la brecha de 3.0 puntos porcentuales y los atrasos por edificio

01

Duplicar frentes de trabajo

Segunda cuadrilla en paralelo en Edificios 13–18 y 70–77 (infraestructura) para trabajar ambos frentes

8–12 días/edificio

02

Turnos extendidos / sábados

Extender jornada a 10h y habilitar sábados en los edificios con mayor atraso (10, 11, 12, 13, 14, 15) hasta emparejar con línea base.

5–8 días/edificio

03

Adelantar compras críticas

Colocar de inmediato las órdenes de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias de los 14 edificios con fecha ya vencida, priorizando 1–9 (0% de avance pese a estructura terminada).

Evita 60–90 días de espera

04

Reprogramar Urbanismo

Priorizar avenidas y calles de acceso a los edificios que entrarán primero en fase de acabados (10, 11, 12) antes que las de fase tardía (70–77).

Evita cuello de botella logístico

05

Refuerzo de subcontratistas

Incorporar 1–2 subcontratistas, liberando presión sobre las cuadrillas actuales.

10–15 días acumulados

Plan de Acción Recomendado

Próximos 90 días — acciones concretas por periodo de tiempo

Inmediato (0–15 días)

- Colocar pedido de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias para los 14 edificios con fecha ya vencida — empezando por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 (vencidos hace 60 a 90 días) y 7, 8, 12.
- Activar segundo frente de trabajo en Edificios 12,11,10,15,14,13 todo lo correspondiente a los revestimientos (30 y 23 días de atraso).
- Confirmar disponibilidad de cuadrillas en la zona.

Corto plazo (15–45 días)

- Colocar pedido de carpintería, ventanas, pisos y piezas sanitarias para los edificios 10,11,13,14,15
- Reprogramar secuencia de Urbanismo: priorizar avenidas/calles y servicios
- Contratar cuadrilla de herrería para fabricación de balcones de Edificios 7–15.

Mediano plazo (45–90 días)

- Colocar pedido de materiales para Edificios 16,17,18,77,76 conforme se acerque su fecha límite.
- Reevaluar la curva de avance con el cierre de estructura para medir efectividad de las medidas de recuperación.
- Actualizar cronograma inicial y línea base para observar si la brecha persiste.

Conclusiones y Riesgos Clave

Hallazgos principales

- El proyecto ejecuta al 86% de eficiencia respecto al plan operativo (18.2% vs. 21.2%).
- El cronograma general acumula solo 5 días de atraso vs. línea base; los edificios 7, 8, 11 y 12 (fase de transición) concentran los mayores atrasos puntuales (9 a 30 días).
- Hallazgo crítico: los Edificios 1–6 y 9 tienen estructura 100% terminada desde marzo–mayo 2026, pero carpintería, herrería y ventanas siguen en 0% — 14 de los 26 edificios ya superaron su fecha límite de pedido.
- Urbanismo avanza solo 4%; las obras de acceso a Edificios 70–77 acumulan hasta 70 días sin iniciar.

Riesgo principal para el hito de mayo 2027

Sin corrección, el atraso actual en estructura se traslada directamente a acabados por el efecto de los tiempos de materiales — el margen de 60–90 días que hoy existe se agota si las órdenes no se colocan de inmediato.

Recomendación: colocar de inmediato el pedido de carpintería, herrería y ventanas para los Edificios 1–9 (estructura ya terminada, 0% de avance en acabados) y activar doble frente en Edif. 7, 8, 10, 11 y 12, para preservar la fecha de cierre y sostener el caso ante el proceso de crédito IFC.



A close-up photograph of several long, green, blade-like leaves of a plant, possibly a palm or agave, arranged diagonally. In the background, a bright sun is shining through the leaves, creating a strong lens flare and illuminating the scene with a warm, golden light. The text "Informe Financiero" is overlaid in the bottom right corner.

Informe Financiero

MENSAJE A DIRECCIÓN

161 unidades vinculadas por USD 21.9M.
Ingresos acum. RD\$746.4M vs Costos RD\$712.3M. Liquidez RD\$48.2M. Jun-26 ejecutó RD\$49.0M.
Préstamo Alaver RD\$40M recibido.

PRESUPUESTO

RD\$3,428.5M

Total del proyecto

EJECUTADO ACUM. JUN-26

RD\$712.3M

20.8% del presupuesto

INGRESOS ACUM. JUN-26

RD\$746.4M

Cltes · AFI · Préstamos · Int.

INDICADORES CLAVE

 Ejecución presup.	20.8%	 Ejecutado jun-26	RD\$49.0M	 CXP al corte	RD\$18.6M
 Anticipos vigentes	RD\$9.2M	 161 uds vinculadas	USD 21.9M	 Liquidez bancaria	RD\$48.2M

PRESUPUESTO TOTAL

RD\$3,591.3M

100% del proyecto

EJECUTADO ACUM.

RD\$712.3M

20.8% del presupuesto

POR EJECUTAR

RD\$2,878.0M

79.2% pendiente

PAGOS ACUMULADOS

RD\$703.0M

98.7% de lo ejecutado

CENTRO DE COSTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PAGADO	% EJC.	JUN-26
◆ CONSTRUCCIÓN						
1-1 Terreno	269.7M	266.8M	2.9M	266.8M	98.9%	-
1-2 Diseño y Proyecto	25.0M	24.2M	0.8M	24.4M	96.6%	-
1-4 Urbanismo	469.2M	50.8M	418.4M	51.5M	10.8%	5.5M
1-5 Edificaciones	1,517.2M	91.0M	1,426.2M	86.0M	6.0%	23.3M
1-6 Gerencia de Construcción	234.4M	39.8M	194.6M	40.5M	17.0%	2.3M
1-7 Indirectos de Obra	47.7M	8.3M	39.4M	7.5M	17.4%	0.7M
1-8 Fondo de Contingencia	39.7M	-	39.7M	-	0.0%	-
1-9 Inspección Técnica	19.3M	5.1M	14.2M	4.6M	26.3%	0.5M
Subtotal CONSTRUCCIÓN	2,622.1M	486.3M	2,135.7M	481.0M	19.8%	32.3M
◆ GASTOS OPERATIVOS						
2-2 Gerencia de Ventas	327.7M	120.6M	207.1M	117.4M	36.8%	9.5M
2-3 Administración Fiduciaria	81.5M	7.0M	74.5M	7.0M	8.6%	1.1M
2-4 Promoción y Publicidad	69.5M	34.3M	35.2M	33.3M	49.3%	2.4M
Subtotal GASTOS OPERATIVOS	686.1M	185.4M	500.7M	180.0M	27.0%	14.7M
◆ OTROS GASTOS						
3-1 Permisos y Preliminares	30.5M	23.2M	7.3M	24.5M	75.9%	0.1M
3-3 Gastos Financieros	232.7M	17.4M	215.3M	17.5M	7.5%	1.8M
Subtotal OTROS GASTOS	283.1M	40.6M	242.5M	42.0M	14.3%	1.9M
TOTALES GENERALES	3,591.3M	712.3M	2,878.0M	703.0M	20.8%	49.0M

TOTAL ACTIVOS

RD\$759.7M

USD 12.8M

TOTAL PASIVOS

RD\$446.2M

58.7% de activos

PATRIMONIO

RD\$313.5M

Activos netos

LIQUIDEZ BANCARIA

RD\$48.2M

USD 0.8M · Disponible

ACTIVOS	RD\$
Banco Alaver (Ahorro DOP)	20,485,843
Banesco DOP (Cta. Corriente)	16,604,331
Banesco USA → DOP	2,615,906
Banesco USD (Ahorro → DOP)	5,003,923
Fondos de Inversión	277,216
Popular (Ahorro + Cte.)	3,247,069
TOTAL CAJA Y BANCOS	48,234,289
Anticipos Proveedores	9,210,449
Costos de Construcción	483,466,061
Costos Operativos	178,249,024
Otros Costos	40,554,300
TOTAL ACTIVOS	759,714,675

PASIVOS Y PATRIMONIO	RD\$
Créditos Inst. Financieras	200,000,000
Cuentas por Pagar Comerc.	18,612,246
Depósitos Diferidos Clientes	220,997,696
Retenciones y Otras CxP	3,983,225
Otras CxP No Corriente	431,409
TOTAL PASIVOS	446,209,905
Aporte Fideicomitentes AFI	322,917,734
Resultado del Ejercicio	(5,939,942)
Resultado Ejercicio Anterior	(3,473,022)
TOTAL PATRIMONIO	313,504,770

TC: RD\$59.57/USD · Dep. Diferidos: RD\$221.0M · Deuda/Activo: 58.7% · Costos en proceso: 93.6% de Activos

TOTAL CXP

RD\$18.6M

Corte 30 junio 2026

CORRIENTE 60.1%

RD\$11.2M

Sin mora

< 1 MES 38.4%


RD\$7.1M

Vencidas < 30 días

ANTICIPOS

RD\$9.2M

27 anticipos vigentes

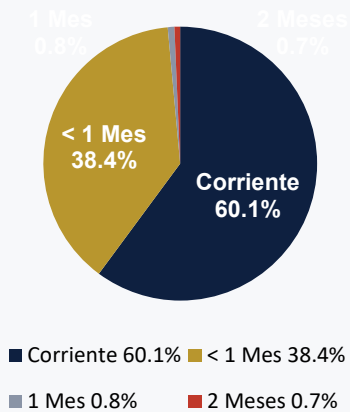

CONCENTRACIÓN CXP

1-5 Edificaciones <i>Blue Wave, Bellon, Kinnox</i>	RD\$9,079,361	48.8%
1-4 Urbanismo <i>Bellon, Rodfor, Gondar</i>	RD\$2,409,540	12.9%
2-2 Comisiones Venta <i>Kiswer, PPCRE, EMI</i>	RD\$4,011,222	21.6%
1-7 Indirectos <i>Seguros Universal, Otros</i>	RD\$806,796	4.3%
1-9 Inspección <i>Ing. Omar Cordero</i>	RD\$506,964	2.7%

TOP ANTICIPOS

Inversiones Romur RD\$2,351,901	25.5%
Dto. Mpal. Turístico RD\$1,691,905	18.4%
Fondo Operativo MMHB RD\$1,367,422	14.8%
Dass Ingeniería RD\$1,440,000	15.6%
Alugav / Fusiontech RD\$1,059,000	11.5%

05 | PROYECCIÓN FINANCIERA

INGRESOS POR FUENTE — Valores en RD\$									
FUENTE DE INGRESO	INGRESOS ACUMULADOS	% PART.	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Total
◆ DEPÓSITOS CLIENTES	220,997,696	-	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	347,299,094
◆ APORTES DE SOCIOS	322,917,734	-	-	-	-	-	-	-	322,917,734
◆ PRÉSTAMOS RECIBIDOS	200,000,000	-	100,000,000	100,000,000	(10,000,000)	-	160,000,000	-	590,000,000
◆ INTERESES	2,442,158	-	-	-	-	-	-	-	2,442,158
TOTAL INGRESOS RD\$	746,357,587	100%	118,000,000	118,000,000	118,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	1,262,683,793
CONTROL PRESUPUESTAL — Valores en RD\$									
CENTRO DE COSTO	PAGOS ACUMULADOS	% EJE.	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Total
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN	480,962,890	68%	125,714,967	82,251,300	82,214,850	76,481,173	74,525,848	65,751,774	1,020,235,693
GASTOS OPERATIVOS	180,037,258	26%	14,737,745	14,737,745	14,737,745	16,502,350	16,502,350	16,502,350	291,593,834
OTROS GASTOS	41,968,495	6%	3,247,917	4,937,500	7,337,500	3,718,750	4,989,583	4,403,333	72,534,344
TOTALES GENERALES RD\$	702,968,643	100%	143,700,628	101,926,545	106,054,700	96,702,273	96,017,781	87,994,391	1,384,363,871
NETO (Ingresos – Costos)	49,199,807		23,499,178	39,572,633	(58,482,067)	(137,184,339)	(55,202,121)	(125,196,511)	(125,196,511)

- Comentarios:**
- **Préstamo Alaver Aug 100M.** Cubre los meses de mayor intensidad en obra. Completa el tramo del crédito vigente por RD\$300 millones. En sept-26 se abona 150 millones con los fondos de IFC.
 - **Préstamo AFI Jul 100M.** Financia el puente entre los meses de alta ejecucion y la entrada del IFC. Se cancela integralmente en septiembre con los fondos IFC.
 - **IFC Oct 240M + Nov 180M.** Financia la fase central de construccion oct-nov. Permite abonar a los creditos puente y sostener la operacion hasta diciembre.

 - **Construcción** — RD\$506.74M (87%). Julio es el mes pico (RD\$125.71M) por arranque de Edificaciones y anticipos a grandes proveedores.
 - **Gastos Operativos** — RD\$100.32M (14%)Gerencia de Ventas representa el 65% del grupo, reflejando comisiones activas por cierre de unidades.
 - **Otros Gastos** — RD\$28.10M (5%)Dominado por Gastos Financieros, que crecen desde noviembre con la activacion del credito IFC.

FIDEICOMISO ARAYA — INFORME JUNIO 2026

INGRESOS POR FUENTE — Valores en millones RD\$

	INGRESOS ACUM. RD\$	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
◆ DEPÓSITOS DE CLIENTES	221.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
◆ APORTES DE SOCIOS	322.92						
◆ PRÉSTAMOS RECIBIDOS	200.00	100.00	100.00	(10.00)		160.00	
↳ AFI Universal (Crédito Puente)		100.00		(100.00)			
↳ Banco Alaver	200.00		100.00	(150.00)		(20.00)	
↳ IFC				240.00		180.00	
◆ INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	2.44						
TOTAL INGRESOS RD\$	746.36	118.00	118.00	8.00	18.00	178.00	18.00
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS RD\$	746.36	864.36	982.36	990.36	1,008.36	1,186.36	1,204.36

CONTROL PRESUPUESTAL — Valores en millones RD\$

CENTRO DE COSTO / AUXILIAR	PAGOS ACUMULADOS	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
◆ CONSTRUCCIÓN							
1-1 Terreno	266.77	1.63	1.29				
1-2 Diseño y Proyecto	24.43						
1-4 Urbanismo	51.54	9.95	25.88	19.02	30.18	22.13	27.73
1-5 Edificaciones	85.98	109.68	50.62	58.72	41.83	47.93	31.47
1-6 Gerencia de Construcción	40.16	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	5.28
1-7 Indirectos de Obra	7.52	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	0.76
1-8 Fondo de Contingencia							
1-9 Inspección Técnica	4.56	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
Subtotal CONSTRUCCIÓN	480.96	125.71	82.25	82.21	76.48	74.53	65.75
◆ GASTOS OPERATIVOS							
2-1 Gerencia de la Promotora	26.84	1.76	1.76	3.53	3.53	3.53	4.74
2-2 Gerencia de Ventas	113.03	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57
2-3 Administración Fiduciaria	6.69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.36
2-4 Promoción y Publicidad	33.48	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.17
2-5 Post Ventas							
Subtotal GASTOS OPERATIVOS	180.04	14.74	14.74	16.50	16.50	16.50	17.84
◆ OTROS GASTOS							
3-1 Permisos y Preliminares	24.54	0.80		0.40			
3-2 Imprevistos							
3-3 Gastos Financieros	17.43	2.45	4.94	6.94	3.72	4.99	4.40
Subtotal OTROS GASTOS	41.97	3.25	4.94	7.34	3.72	4.99	4.40
TOTALES GENERALES RD\$	702.97	143.70	101.93	106.05	96.70	96.02	87.99
TOTALES GENERALES ACUMULADOS RD\$		846.61	948.54	1,054.59	1,151.29	1,247.31	1,335.31
Otras cuentas por pagar	5.75						
NETO (Ingresos – Costos) RD\$	49.20	(25.70)	16.07	(98.05)	(78.70)	81.98	(69.99)
NETO (Ingresos – Costos) RD\$ Acumulados	23.50	23.50	39.57	(58.48)	(137.18)	(55.20)	(125.20)

Gestiones Financieras

IFC

Financiamiento aprobado. En proceso de formalización:

- Debida diligencia por abogados locales
- Firma del contrato de crédito y primer
- Desembolso previsto para julio 2026.

GESTIONES CON BANCA LOCAL

ALNAP	Preaprobación por DOP 1,400 millones. A la espera del permiso definitivo y título de terreno.
BLDH	Aprobación de la primera fase por DOP 495 millones. A la espera del permiso definitivo y título.
POPULAR	Preaprobación de la primera fase por DOP 500 millones.
SANTA CRUZ	En revisión. Preaprobación de DOP 440 millones para la Fase I.
ALAVÉR	Evaluando ampliación de la línea de crédito a DOP 300 millones como previsión ante retrasos del IFC.

Puntos para Aprobación

1

Línea de Crédito AFI

Monto solicitado para aprobación: RD\$ 100 millones.



GRACIAS

@arayapuntacana

www.arayapuntacana.com
